

Projekt Stadtpark Obere Weierwise

1. Ausgangslage

- Enthalten im kommunalen Richtplan
- Angezeigt im Finanzplan 2014-18 mit rund 2.3 Mio. Franken
- Abstimmung mit weiteren Bauvorhaben, wie Hochwasserschutz und Radwegen
- Antwort Stadtrat auf Motion betr. zeitlicher Ablauf

2. Ziele

Rahmenbedingungen

- Relevante Ansprüche von Nutzern, Anstößern, Bewirtschaftern, Stadtbevölkerung sind zu berücksichtigen - Betrachtungshorizont 10-20 Jahre.
- Einschränkende Rahmenbedingungen wie Hochwasserschutz, Siedlungsentwicklung sind zu erfassen.
- Festlegung des inhaltlichen und zeitlichen Rahmens. Abstimmung der verschiedenen Projekte im Raum. Aufnahme der finanziellen Mittel im Investitionsplan.
- Gestalterisch hochwertiges Projekt mittels Konkurrenzverfahren
- Evtl. wird aufgrund möglicher Hochbauten ein Gestaltungsplan notwendig.
- Perimeter Obere Weierwise und Gebiet beim Stadtweier
- Der zeitliche Horizont bei der Umsetzung in Etappen beträgt 15 Jahre.

Inhalte:

Der Inhalt des Projektes „Stadtpark Obere Weierwise“ mit Teilprojekten wird von Grund auf unter Berücksichtigung der strategischen Ziele und der Anliegen der Betroffenen überprüft und gestaltet. Auch Bewährtes darf/soll hinterfragt, Neues eingebracht werden.

Prozess:

- unter Einbezug der Interessenvertreter
- Begleitung durch externes Planungsbüro
- Mitwirkung von Fachleuten
- Anhörung von Nutzern und Bewirtschaftern
- Partizipation der Bevölkerung, inkl. Kinder und Jugendlicher


Organisation / Ressourcen


- Schlanke Projektorganisation, trotz Partizipation
- Prozess wird durch verwaltungsunabhängiges Planungsbüro geführt
- Beratung durch Fach-Experten, wo Knowhow und Ressourcen fehlen

Partizipation / Mitwirkung


- Breite Abstützung durch Einbezug Betroffener und Gesamtbevölkerung
- Durchführung von Foren und Vernehmlassung
- Parallel dazu und nachgelagert: Entscheidungsprozess auf politischer Ebene

3. Ablauf - Schema

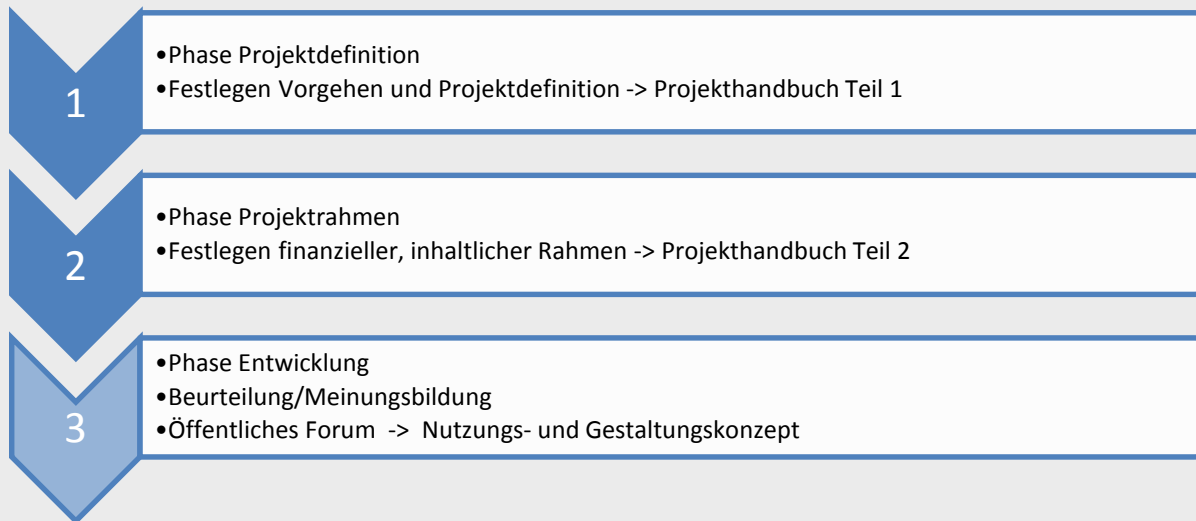

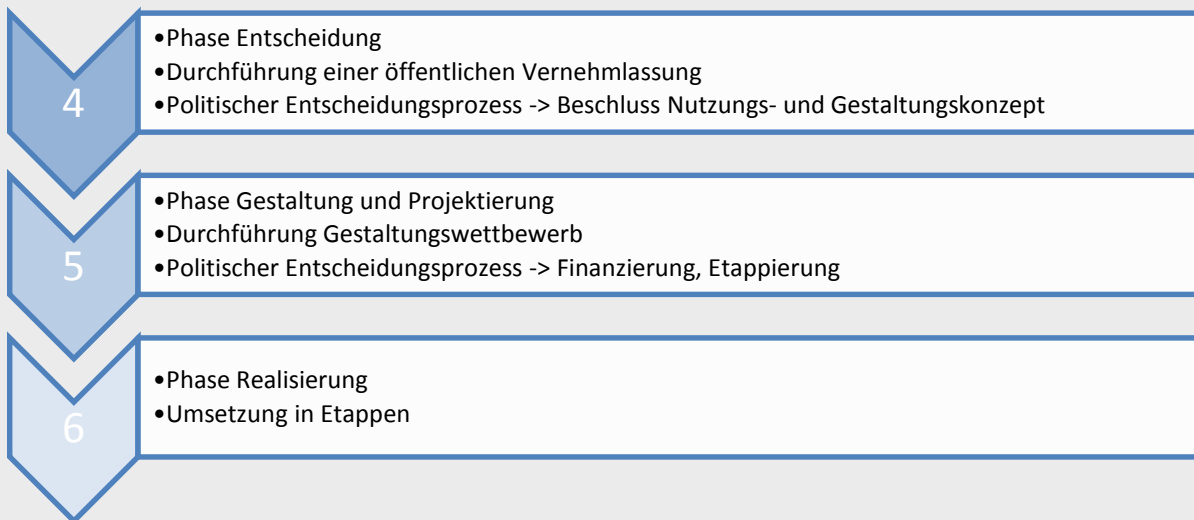

4. Projektorganisation - Bild

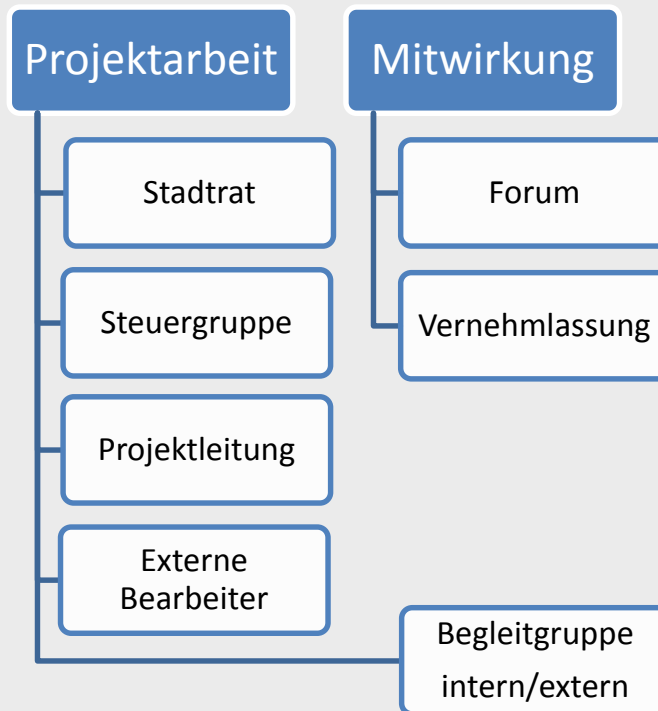

Steuergruppe

Mitglieder

- Stadtpräsidentin Susanne Hartmann
- Stadtrat Marcus Zunzer, Vorsteher Departement BUV
- Mitglieder Projektleitung
- Zwei Mitglieder aus der IG Weierwise

- Fachpersonen je nach Thema (beratend)

5. Terminplan – Grober Zeitraster

Projektphasen	2015			2016				2017				2018				2019				2020		
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
1. Projektdefinition																						
- Vorgehen und Projektdefinition																						
2. Projektrahmen																						
- Finanzieller, inhaltlicher Rahmen																						
- Beschluss Projekthandbuch durch Stadtrat																						
3. Entwicklung																						
- Beurteilung/Meinungsbildung																						
- Öffentliches Forum																						
4. Entscheidung																						
- Durchführung einer öffentlichen Vernehmlassung																						
- Politischer Entscheidungsprozess																						
- Beschluss Nutzungs- und Gestaltungskonzept																						
5. Gestaltung und Projektierung																						
- Vorbereitung Gestaltungswettbewerb																						
- Durchführung																						
- Nachbereitung																						
- Politischer Entscheidungsprozess																						
6. Realisierung																						
- Umsetzung in Etappen																						

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen ?

